

Agenda Steuerungskreis UBA TF Umwelt (06.05.)



1 Umsetzungsprojekt im TF Umwelt – UBA

2 Aktuelle Informationen aus dem Programmmanagement / dem TF Umwelt

- Ergebnis-Update: RP übergreifender Austausch zum SI8
- Austausch zu Risikomanagement

3 Sonstiges und weitere Schritte

- Erinnerung: MS 1 Abnahme – interne Vorfrist
- Erinnerung HKR Export April
- Nächste Schritte/Termine

1. Umsetzungsprojekt im TF Umwelt – UBA

Themenfeld Umwelt Umsetzungsprojekt Emissionserklärung

Name	Bericht-ZR	Datum	MS 1	MS 2	MS 3
	April 2022	05.05.2022	●	○	○

Aktueller Stand in der OZG-Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Analyse BUBeneu Basispaket durch DL Bechtle und Darstellung der zu behandelnden Defizite vor einer Fortführung durch Bechtle. Installation des Basispakets auf einer Bechtle Umgebung für die Abnahme. DL WPS implementiert offene User Stories und unterstützt die Abnahme des BUBeneu Basispakets. FIM: Stammprozessmodell für MVP PRTR in Bearbeitung (ca. 70 % Fortschritt), sowie Stammtexte (ca. 60 %) und OZG-Referenzprozessmodelle (ca. 75 %). Abschluss-Ws PRTR KW20. Pflege der notwendigen PM-Artefakte (Scope, Planung, Risiken, Stakeholder, ...). MS2 entspricht MS3 – Mittelplanung verändert/ genehmigt. Kündigung des VKoopUIS-Projekts BUBE durch UBA 1. Workshop mit Ländern zur Nachnutzung (betrifft SI15 und SI21). 												
Nächste Schritte in der OZG-Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Abnahme des BUBeneu Basispakets (ohne OZG-Anpassungen) als Basis für OZG-Projekt im Mai geplant. Aufbau der Backlogs für die einzelnen Module: Basispaket mit OZG-Anpassungen, PRTR, GFA und 11. BImSchV. Weitere Workshops mit den Ländervertretern zur Ermittlung der Anforderungen an die Fachmodule. FIM: Finalisierung FIM-Stamm- & OZG-Referenzinformationen, Finalisierung Stammtexte für MVP PRTR, Erstellung FIM-Artefakte für GFA und anschl. 11. BImSchV. Befüllung BMUV BSCW-Arbeitsbereich zur Freigabe MS1 und OZG-IP. Weitere Workshops mit Ländern zum Thema der Nachnutzung. 												
Entscheidungsbedarfe / Risiken in der OZG-Leistung	<p>Mögliche Risiken:</p> <ol style="list-style-type: none"> SW des Basispakets erfüllt nicht die Anforderungen für die Übernahme durch Bechtle in das OZG-Projekt Abnahme Basispaket erfolgt nicht bis Ende Mai Schwierige Abstimmungen und Teambuilding aufgrund vieler unterschiedlicher Beteiligter Zeitliche Umsetzung aller Leikas und Anbindung der Behörden der Bundesländer ggf. schwierig (kurze Projektlaufzeit, OZG-Anforderungen) Neue Anforderungen seitens Länder an das OZG-Projekt herantragen, aber Fokus auf Umsetzung der bisher mit BUBE abgewickelten Berichtspflichten Leistungszuschnitt weiterhin unbestätigt 												
Entscheidungsbedarfe / Risiken: Steuerungskreis	<p>Mögliche Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Frage der Nachnutzung kann nicht final bis zum MS1 geklärt werden (AG) Hoster steht nicht zeitgerecht zur Verfügung für das OZG-Projekt Verlängerung Projektlaufzeit bzw. Mittelverfügbarkeit in 2023 voraussichtlich nicht gegeben 												
Begründung des Ampel-Status Projektbeginn, alle Aktivitäten laufen an, hohe mögliche Risiken erkennbar													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OZG-ID</th> <th>OZG-Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10494</td> <td>- Emissionserklärung</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		OZG-ID	OZG-Leistung	10494	- Emissionserklärung	-	-	-	-	-	-	-	-
OZG-ID	OZG-Leistung												
10494	- Emissionserklärung												
-	-												
-	-												
-	-												
-	-												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Meilensteinplanung lt. Projektantrag (bleibt unverändert)</th> </tr> <tr> <th>M1</th> <th>M2</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.06.2022</td> <td>31.12.2022</td> <td>31.12.2022</td> </tr> <tr> <td>91.910,33 €</td> <td>3.594.769,08 €</td> <td>673.434,75 €</td> </tr> </tbody> </table>		Meilensteinplanung lt. Projektantrag (bleibt unverändert)			M1	M2	M3	30.06.2022	31.12.2022	31.12.2022	91.910,33 €	3.594.769,08 €	673.434,75 €
Meilensteinplanung lt. Projektantrag (bleibt unverändert)													
M1	M2	M3											
30.06.2022	31.12.2022	31.12.2022											
91.910,33 €	3.594.769,08 €	673.434,75 €											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Allianzinformationen (Beteiligte und Größe)</th> </tr> <tr> <th>Beteiligte Länder</th> <th>Weitere Kommentare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Allianzinformationen (Beteiligte und Größe)		Beteiligte Länder	Weitere Kommentare								
Allianzinformationen (Beteiligte und Größe)													
Beteiligte Länder	Weitere Kommentare												

Themenfeld Umwelt

Umsetzungsprojekt Emissionserklärung – Konzeption/Meilenstein 1

SI *	Liefergegenstand	Kommentar	Plandatum	Status	EFA-Mindestanforderung*	Kommentar	Plandatum	Status
4	Unterzeichnete EV	Nach Abstimmung mit BMUV nicht relevant für das Projekt BUBEneu.	N/A	-	OD1 – neutrales Design	Umsetzung der Anforderungen ist eingeplant. Design wird durch bereits implementiertes Basispaket von BUBEneu vorgegeben.	31.12.2022	●
	E-Mail an BMHP/GMT	Nach Abstimmung mit BMUV nicht relevant für das Projekt BUBEneu.	N/A	-	OD3 – zuständige Behörde anzeigen	Über diese Funktion verfügt BUBE-Online bereits. Auch in BUBEneu wird eine autom. Zuständigkeitsfindung implementiert.	31.12.2022	●
8	Bestätigter/validierter Leika-Auszug aus der OZG-IP und Meldung an FF-Ressort	Leika-Auszug liegt vor. Die durch das Projekt neu beantragte Leika-ID für „Abgabe PRTR-Bericht“ ist noch nicht verfügbar.	16.06.2022	●	OD4 – zuständige Behörde mittels Leika-ID ermittelbar	Umsetzung wird im Rahmen der Entwicklung geprüft.	31.12.2022	●
	Falls <80%: Bestätigung des Wesenskerns durch das Bundesressort	Nicht relevant, da zum Rollout 100% aller Leika-IDs durch BUBEneu abgebildet werden	N/A	-	F1 – bundesrechtl. Anforderungen erfüllen	BUBE-Online orientiert sich an EU- und Bundesrecht. BUBEneu.dio. Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen erfolgt im Rahmen von BUBEneu.	31.12.2022	●
9	ÖZG-Referenzprozesse + ÖZG-Referenzdaten	ÖZG-Referenzprozesse (RPM) + ÖZG Referenzdaten (RD) für das MVP befinden sich aktuell in der Entwicklung.	16.06.2022	●	F2 – landesrechtl. Anforderungen erfüllen	Landesrechtliche Zusatzanforderungen werden im Rahmen der Implementierung gewürdigt.	31.12.2022	●
	Link zu Referenz-Repositories	Erfolgt nach Finalisierung des ÖZG-RPM und der –RD für das MVP.	16.06.2022	●	NK1 – interoperables NK angebunden	Da ausschließlich juristische Personen BUBE nutzen, wird voraussichtlich das ELSTER-ÖK als NK angebunden. In Prüfung.	31.12.2022	●
12	Benennung Fachgremium & Ablage der Präsentationsunterlagen	Die Umsetzungsalianz der Bundesländer bildet das Fachgremium. Der Vertragentwurf wird durch VkoopUIS erstellt (siehe SI 15).	16.06.2022	●	DS1 – Antragsdaten standardisiert ausgeben	Aktuell sind manuelle Importe / Exporte über XML-Schnittstellen in BUBE-Online möglich. Ggf. Nutzung von XUBetrieb zur Standardisierung = aktuell nutzen Länder verschiedene, nicht-harmonisierte IT-Fachverfahren. In Prüfung.	31.12.2022	●
	Eintrag auf ÖZG-Marktplatz		16.06.2022	●	DS2 – Standardisierungsprozess für Datenschnittstelle aufgesetzt	XOV-Standard und XML-Referenztabellen existieren bereits. Nachnutzung wird im Projekt realisiert.	31.12.2022	●
13	Entwurf XFallXÖV-Schnittstellendefinition	XUBetrieb existiert bereits. Nachnutzung wird im Projekt überprüft und ggf. implementiert.	16.06.2022	●	DS3 – strukturierte Ausgabe des Antrags im XFall-Format	XFall wird nach Aussage der FITKO nicht weiterentwickelt und wird daher auch in diesem Projekt nicht tiefergehend betrachtet.	N/A	-
	Bestätigung über Abbildung bundesrechtl. Regelungen und über Beteiligung der FV-Hersteller	FIM-Stammprozessmodelle definieren das MVP auf Basis von EU- und Bundesrecht. Aus ÖZG-Referenzprozess (MVP ISTI-Prozess) wird der MVP SOLL-Prozess abgeleitet.	16.06.2022	●	RT2 – techn. Adressierung mittels Zugriff auf DVDV ermittelbar	DVDV-Anbindung wird geprüft.	31.12.2022	●
14	Link zu XRepository oder zum FIM-Datenfeld-Repository	Erfolgt nach Finalisierung Stammdatenschemata.	16.06.2022	●	RT3 – DVDV-Eintragungskonzept erstellt	DVDV-Anbindung wird geprüft.	31.12.2022	●
	Anbindungskonzept	Anbindungskonzept wird im Rahmen des Projekts erstellt. BUBE-Online besitzt bereits eine funktionierendes System von XML-Schnittstellen zur Anbindung von Fremdsystemen. DVDV-Nutzung wird geprüft.	16.06.2022	●	RT4 – zu transportierende Daten über OSCL-Sender senden können	Umsetzung wird im Rahmen der Entwicklung geprüft	31.12.2022	●
15	Entwurf für rechtliche Nutzungsmöglichkeit	Entwurf VwV wird durch VkoopUIS erstellt. Federführend ist in diesem Punkt das UBA.	16.06.2022	●	R1 – rechtl. NM-Vögl. angeboten	BUBE-Online wird heute von allen Ländern verwendet. Wird im Rahmen der VkoopUIS neu vereinbart.	31.12.2022	●
	Bei Nutzung FIT-Store: Schriftliche Abstimmung FITKO	Nutzung des FIT-Stores ist durch das Projekt nicht geplant.	N/A	-	R2 – ausreichende Lizenzrechte vorhanden	Für die Realisierung von BUBEneu werden Open-Source-Komponenten verwendet.	31.12.2023	●
					O1 – organisatorische Zusammenbaustruktur geschaffen	Wurde temporär für die Realisierung von BUBEneu geschaffen. Hinsichtlich der weiteren Pflege nach Projekt muss die Verantwortlichkeit geklärt werden (siehe SI15 & SI21)	31.12.2023	●

Themenfeld Umwelt

UP Emissionserklärung – Referenzimplementierung und Rollout in anderen Ländern/Meilenstein 2 & 3

SI*	Liefergegenstand	Kommentar	Plandatum	Status
17	Besätigung der FIM-Leistungsbeschreibungen und OZG-Referenzinformationen durch nachnutzendes Land	FIM- und OZG-Informationen werden im Zuge des projektierten Redaktionsprozesses durch Bund und Länder qualitativ gesichert.	31.12.2022	●
	Übermittlung der FIM-Leistungsbeschreibungen an FIM-Bundesredaktion	FIM-Stamm- & OZG-Referenzinformationen des MVP werden Bundesredaktion bis 30.05.2022 zur Qualitätssicherung zur Verfügung gestellt.	31.12.2022	●
21	Zeichnungsfähige Bereitstellung einer rechtlichen Nachnutzungs-möglichkeit	VwV wird im Rahmen des MS1 durch VKoopUIS erstellt.	31.12.2022	●
	Bereitstellung MVP im Online Gateway	PVOG-Einbindung muss durch die Aufnahme in ein Landesportal angestoßen werden. Dieses Land muss definiert werden. BUBEneu enthält zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich die GFA und PRTR Fachmodule (MVP = PRTR). EE wird ggf. später in 2023 live geschaltet.	31.12.2022	●
23	Link zur Implementierung auf OZG-IP (MVP)	Erfolgt sobald die endgültigen Informationen vorliegen.	31.12.2022	●
	Betriebs- und Servicekonzept (MVP)	Alle notwendigen Dokumente und Konzepte werden im Rahmen der Entwicklung erstellt.	31.12.2022	●
	Bereitstellung Onlinedienst mit allen umsetzungsrelevanten Leikas im Online Gateway	EE wird u. U. im Jahr 2023 live geschaltet. EE ist nicht relevant für die Berichtspflichten der Anlagenbetreiber in 2023.	2023	●
25	Link zur Implementierung auf OZG-IP	Erfolgt sobald die endgültigen Informationen vorliegen.	2023	●
	Reifegrad-Bestätigung für alle umsetzungsrelevanten Leikas	Vollständige Prüfung (Reifegrad 3) durch das BMUV in 2023. GFA, PRTR kann in 2022 geprüft durch das BMUV werden.	2023	●


*Meilensteinrelevante Steuerungsindikatoren



2. Aktuelle Informationen aus dem Programmmanagement / dem TF Umwelt

– Ergebnis-Update: RP Austausch zum SI8

- Ausgangslage: LZ Anlagenbetrieb und –prüfung am 28.04. zur erneuten Prüfung an die Bundesredaktion übersendet → aktuell kein geprüfter LZ als Grundlage der Validierung vorliegend
- Abgestimmtes Vorgehen:
 - 1. Letzten an die BRed zur Prüfung übermittelten Leika-Auszug durch Ticket an die OZG-AM auf die OZG-IP bringen
 - 2. Entsprechenden Auszug als geklärt betrachten und Validierung vornehmen
 - 3. Validierten Leika-Auszug zur Prüfung an das BMUV geben
 - 4. Weiterleitung an und Prüfung durch das ASM-Team
 - 5. Meldung an OZG-Anforderungsmanagement und Markierung auf OZG-IP („Bestandteil der Referenzimplementierung“)



Tiefergehendes Verständnis zu den länderseitig angezeigten Risiken



Programmbezogene Risiken der Länder werden über das Programm-Risikomanagement beobachtet, bewertet und adressiert.

Dafür bedarf es aber einem ausreichenden Verständnis für diese Risiken.

- Das betrifft den **konkreten Risikoinhalt/-zusammenhang** (Beispiel i. Z.m. den Basiskomponenten: Welche Komponenten fehlen konkret?).
- Das betrifft die Frage, **wie weitreichend** ist ein UP von einem Risiko **betroffen**, unter Rückgriff auf **Kennzahlen** (z.B. betrifft dies nur eine LeiKa? Oder alle? Wie viele FIM-Bausteine sind betroffen? Etc.)
- **Bewertungen des Risikos** aus Ländersicht (Schadenshöhe + Eintrittswahrscheinlichkeit)

Die Ausführungen zu den Risiken auf den Statusfolien reichen hierfür vielfach nicht aus, zeigt die Praxis.

Um die Länderrisiken auf Programmebene besser weiterverfolgen zu können, aber auch für die Beantwortung der Frage, was getan werden kann und wie das BMUV/TF-Beratung hierbei besser unterstützen kann (bspw. mit der PM-Unterstützung), braucht es mehr Transparenz zu den Risiken.

Themenfeld Umwelt RP OZG Leistung XYZ (OZG-ID)

Name	Bericht-ZR	Datum	MS 1	MS 2	MS 3
------	------------	-------	------	------	------

Name des/der Erstellenden

Berichts-zeitraum

Erstellungs-datum



Aktueller Stand in der OZG-Leistung

- Beschreibung der wesentlichen Aktivitäten im Berichtszeitraum (Was ist im vergangenen Monat passiert?)

Nächste Schritte in der OZG-Leistung

- Beschreibung der wesentlichen Aktivitäten für den anstehenden Berichtszeitraum (Was sind die nächsten Schritte? Ist in der nächsten Zeit ein Go-Live geplant?)

Begründung des Ampel-Status

Begründen Sie kurz den Status bspw. hinsichtlich abweichender Zeitplanung, Finanzplanung, Ressourcenplanung oder Mängel bei wichtigen Liefergegenständen.

Meilensteinplanung lt. Projektantrag (bleibt unverändert)		
M1	M2	M3
TTMMJJJ	TTMMJJJ	TTMMJJJ
...€	...€	...€

Allianzinformationen (Beteiligte und Größe)	
Beteiligte Länder	Weitere Kommentare

Übersicht der Top-5-Risiken im Projekt


Konkrete Risikobeschreibung <i>Nennung der derzeit größten, akuten Risiken im Projekt. Wie lässt es sich konkret beschreiben?</i>	Betroffene Ebene + Eingrenzung <i>Welche Ebene ist betroffen (UP, Land, Bund)? Wie kann Risiko quantifiziert/abgegrenzt werden (z.B.: Anzahl betroffener Leikas)</i>	Bewertung <i>Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit (E) und die Schadenshöhe (S) auf 1-5-Skala? Zeitdimension (Z): Wie zeitkritisch?</i>	Maßnahmen und Entscheidungsbedarfe <i>Welche Maßnahmen gibt es zum Umgang mit Risiko? Entscheidungsbedarfe?</i>
Kündigung PL zum 01.06., bisher kein Ersatz	UP: „ABP“ (4 OZG-Leistungen)	E: 4/5; S: 3/5., Z: 1 Monat bis PL-Wegfall	Weitere Unterstützung bei DL & BMUV angefragt
BRed hat am 11.04. Leika-Zuschnitt erneut wg. Verrichtungsdetails abgelehnt	UP: 10 (von 12) Leikas in OZG – L “Wasserbuch”	E: 5/5; S: 1/5, Z: noch 6 Wochen bis MS Vorfrist, Zuschnitt bis spätestens 01.05. benötigt	Überarbeitung Leika-Zuschnitt, Gespräch mit BRed, Evaluierung alternative Vorgehen
IT DL Vertrag läuft zu 30.6. aus - ohne Neuausschreibung kein IT DL ab 01.07.	Land: RP	E: 3/5; S: 5/5, Z: 2 Monate verbleiben, absolute Priorität in der Bearbeitung	Neuausschreibung, Verhandlung mit DL über Vertragsverlängerung
...
...

Fiktive Beispiele




3. Sonstiges und weitere Schritte

Erinnerung Vorfrist MS 1 Abnahme

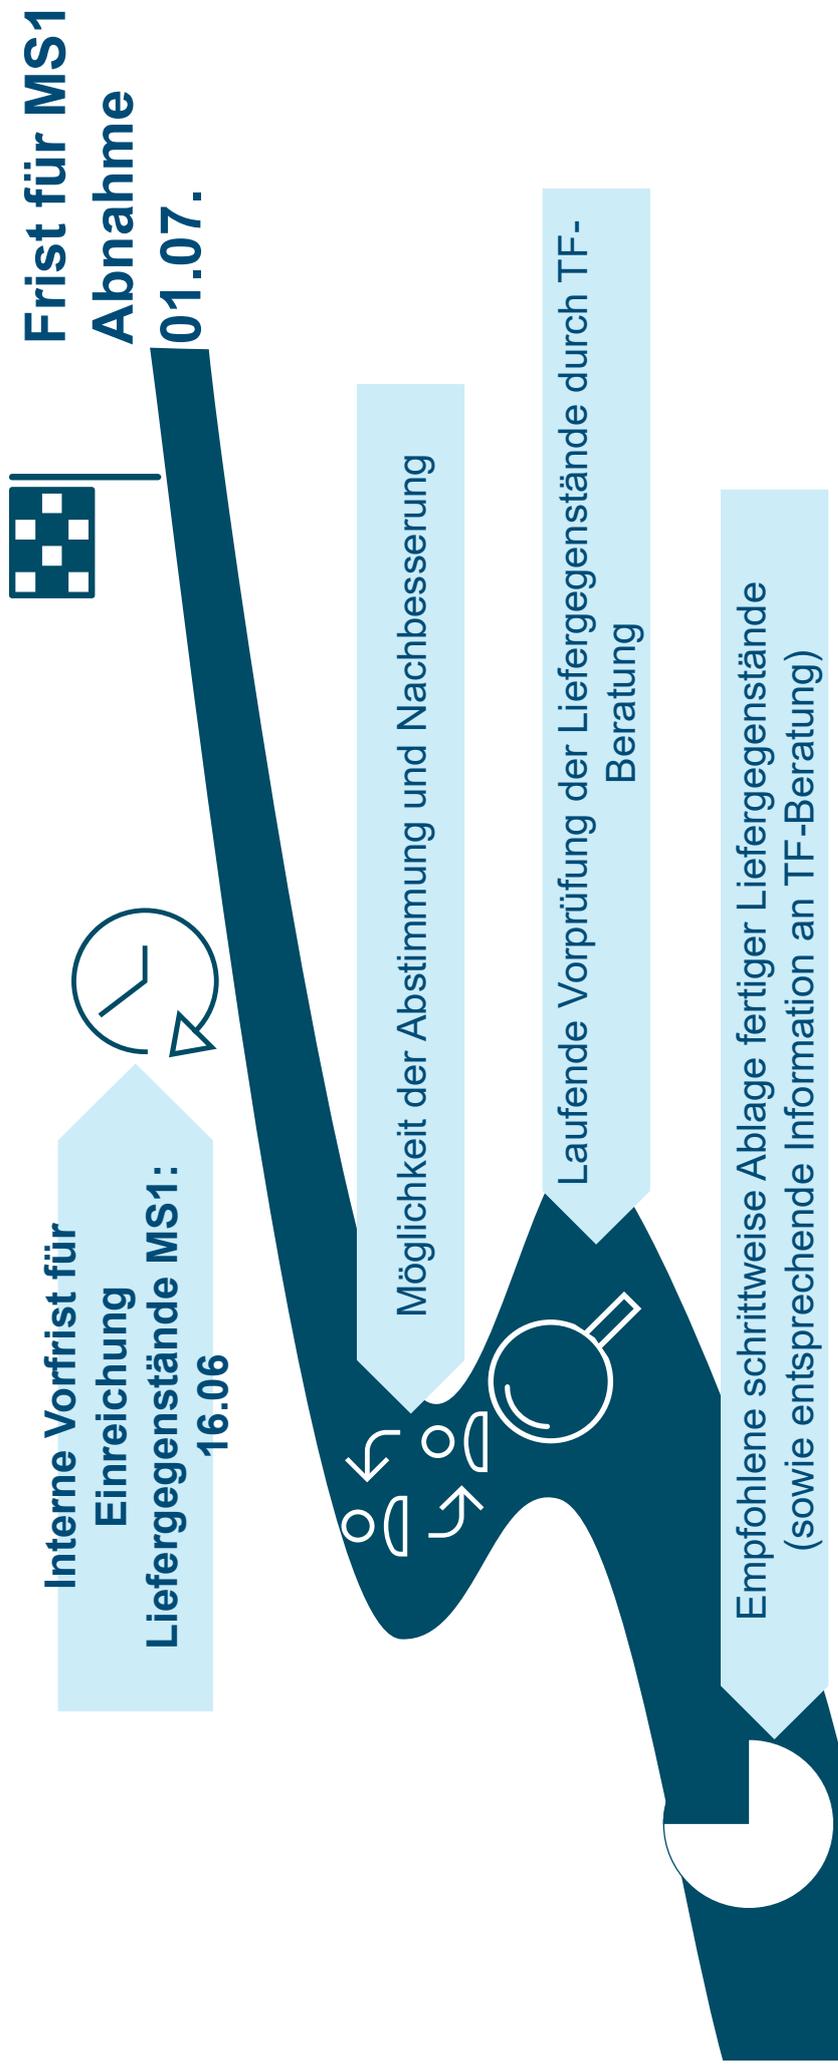

Sonstiges

- Erinnerung an regelmäßige Übermittlung der HKR-Buchungsauszüge
 - Die Länder müssen bis zum 10. eines Folgemonats die verausgabten Konjunkturpaket-Mittel als HKR Export an foederal.monitoring@ozgumsetzung.de melden.
 - Wurden keine Ausgaben getätigt, ist entsprechend eine Leermeldung vorzunehmen
 - Die Angabe der PA-ID ist unbedingt notwendig
 - Bitte senden Sie den Export zeitgleich an das BMUV (Hr. Süner) und die zuständigen TF-Beraternden
- Haben Sie sonstige Fragen oder Anmerkungen?



Nächste Schritte/Termine

- Der nächste Steuerungskreis **TF Umwelt** findet am **12.05.2022** statt.
- Der nächste Steuerungskreis **BMUV-UBA** findet am **02.06.2022** statt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

TF-Leitung (BMUV):

[REDACTED]
Z III 3
T +49 (0)30 18 305-4 [REDACTED]
[REDACTED]@bmuvm.bund.de

[REDACTED]
Z III 3
T +49 (0)30 18 305- [REDACTED]
[REDACTED]@bmuvm.bund.de

[REDACTED]
Z III 3
T +49 (0)30 18 305- [REDACTED]
[REDACTED]@bmuvm.bund.de

TF-Unterstützung (PD/BP):

[REDACTED]
Manager
M + [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
Senior Consultant
M [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
Senior Consultant
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
Business Consultant
M [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
Business Consultant
M [REDACTED]
[REDACTED]

